
1° Seminário – ESII



Trabalho: War


Escopo do produto

Diagrama de casos de uso




Escopo do produto

Diagrama de atividades

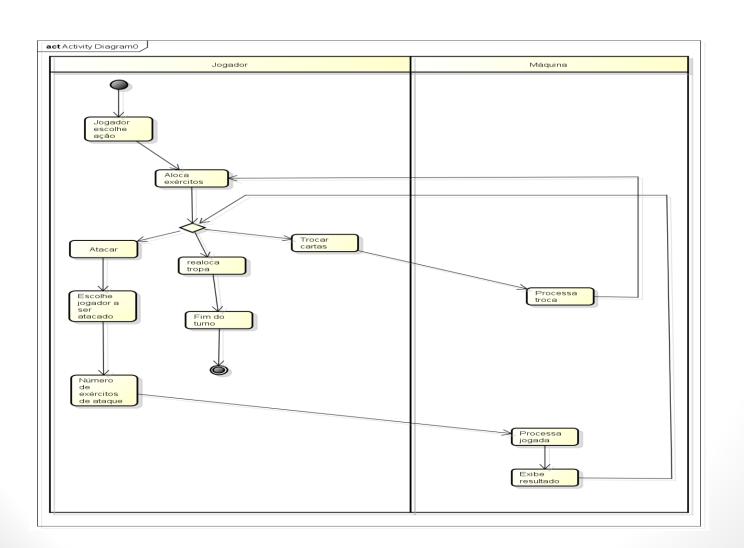


Escopo do produto

Diagrama de Classes com abordagem conceitual

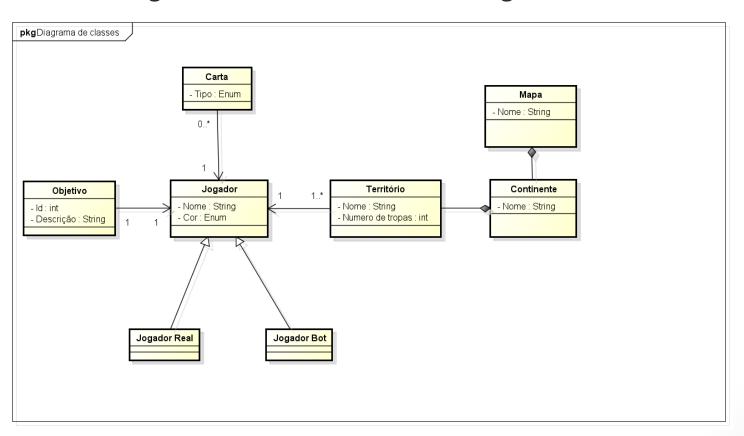


Escopo do projeto

WBS

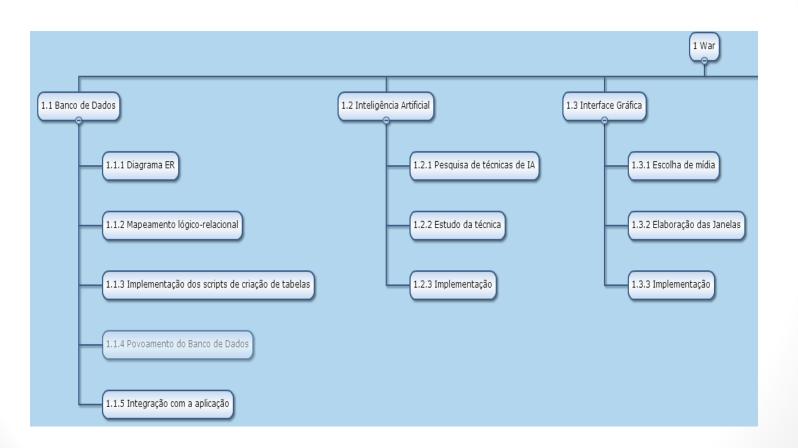

Escopo do projeto

WBS

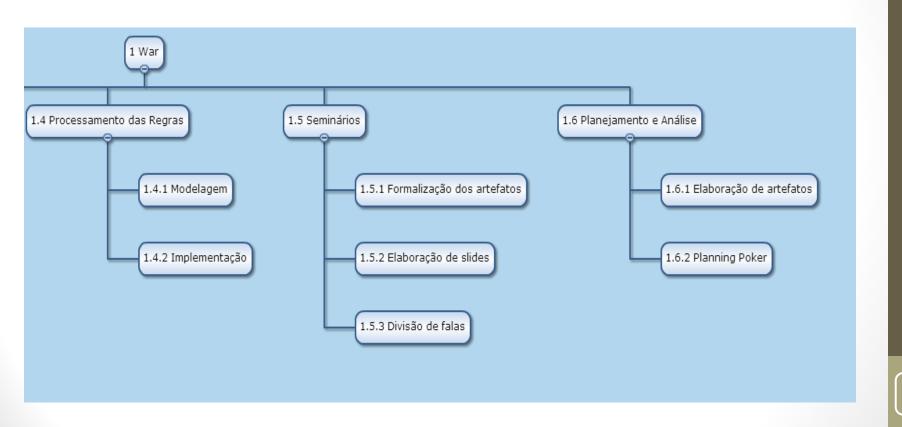

Estimativa de esforço

- Estimado via sessões de Planning Poker usando os pacotes de trabalho definidos pela WBS
- Esforço total: 148 homem-hora

Estimativa de Custo

- Valor recursos humanos: R\$ 20,00 por Homem-hora de trabalho
- Custo total: 148 homem-hora x R\$ 20,00 = R\$ 2960,00


Orçamento

- Orçamento = Custo total + Margem de lucro
- Orçamento = R\$ 2960,00 + (0.3)*(2960,00) = R\$ 3848,00

Cronograma

-5	■ Banco de Dados	26,63 dias	Sex 05/09/14	Seg 13/10/14		
*	Modelagem Banco	1 hr	Sex 05/09/14	Sex 05/09/14		Filipe e Hugo
*	Mapeamento lógio	2 hrs	Sex 05/09/14	Sex 05/09/14	2	Filipe e Hugo
*	Implementação do	2 hrs	Sex 05/09/14	Sex 05/09/14	3	Filipe e Hugo
*	Povoamento do BI	5 hrs	Sex 12/09/14	Sex 12/09/14	4	Filipe e Hugo
*	Integração com a a	13 hrs	Sex 10/10/14	Seg 13/10/14	5	Filipe e Hugo
-5		23,13 dias	Sex 19/09/14	Qua 22/10/14		
*	Análise	4 hrs	Sex 19/09/14	Sex 19/09/14		
*	Estudo da técnica	15 hrs	Sáb 18/10/14	Seg 20/10/14		
*	Implementação da	10 hrs	Seg 20/10/14	Qua 22/10/14	9	
-5		3 dias	Sex 05/09/14	Ter 09/09/14		
*	Escolha das mídias	7 hrs	Sex 05/09/14	Sex 05/09/14		
*	Elaboração das jan	5 hrs	Sáb 06/09/14	Sáb 06/09/14		
*	Implementação da	16 hrs	Seg 08/09/14	Ter 09/09/14	13	
-		8,75 dias	Sex 26/09/14	Qua 08/10/14		
*	Modelagem	8 hrs	Sex 26/09/14	Sex 26/09/14		
*	Implementação	30 hrs	Sex 03/10/14	Qua 08/10/14	16	
-	■ Seminários	47,25 dias	Seg 08/09/14	Qua 12/11/14		
-5	▲ 1° Seminário	2,25 dias	Seg 08/09/14	Qua 10/09/14		
*	Elaboração dos	5 hrs	Seg 08/09/14	Seg 08/09/14		João
*	Elaboração de s	6 hrs	Seg 08/09/14	Ter 09/09/14	20	João
*	Divisão das fala:	2 hrs	Qua 10/09/14	Qua 10/09/14	21	João, Filipe, Hugo, Al
-5	⁴ 2° seminário	0,75 dias	Seg 20/10/14	Seg 20/10/14		
*?	Elaboração dos	5 hrs				
*?	Elaboração dos	5 hrs				
*	Elaboração de s	6 hrs	Seg 20/10/14	Seg 20/10/14		
*?	Divisão das fala	2 hrs				
-5		2,25 dias	Seg 10/11/14	Qua 12/11/14		
*	Elaboração dos	5 hrs	Seg 10/11/14	Seg 10/11/14		
*	Elaboração de s	6 hrs	Seg 10/11/14	Ter 11/11/14	28	João
*	Divisão das fala	2 hrs	Qua 12/11/14	Qua 12/11/14		João, Filipe, Hugo, Al

Gráfico de Gantt

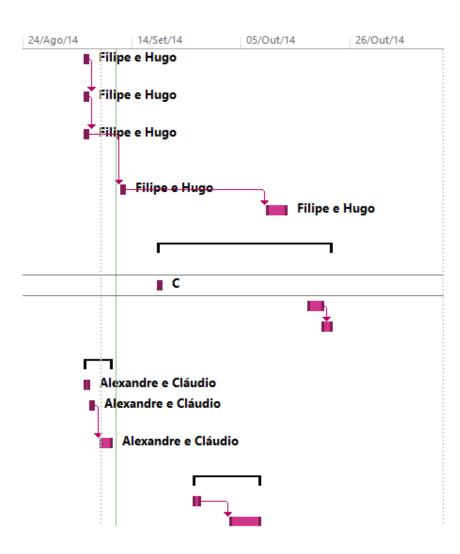

- Aluno desistir da matéria e por consequência do trabalho.
- Probabilidade: 20%
- Impacto: 1
- Contenção: motivar os colegas a continuarem na disciplina e ajudá-los em casos de dificuldade.
- Contingência: Redistribuir tarefas entre os membros restantes.

-Estimativa errada dos prazos.

Probabilidade: 60%

Impacto: 0,6


- Contenção: Não esperar demais do grupo, sempre levando em conta as outras matérias de modo que os erros venham ser pequenos, e que se existirem sejam erros que dão folga.
- Contingência: Em casos de erros para baixo, que apertam o prazo, uma redistribuição de tarefas e maior esforço do grupo para encerrar o trabalho.

- Estimativa errada dos custos.
- Probabilidade: 0,6
- Impacto: 0,8
- Contenção: Seguir os modelos aprendidos em aula para evitar cálculos errados.
- Contingência: Recalcular os custos.

- -Subestimar a complexidade das tecnologias escolhidas
- Probabilidade: 0,6
- Impacto: 0,8
- Contenção: Troca de experiência e aprendizado constante entre a equipe.
- Contingência: Animar o grupo a focar mais no aprendizado e buscar ajuda com outras pessoas.

Monitoramento e Controle

Gráfico de valor agregado

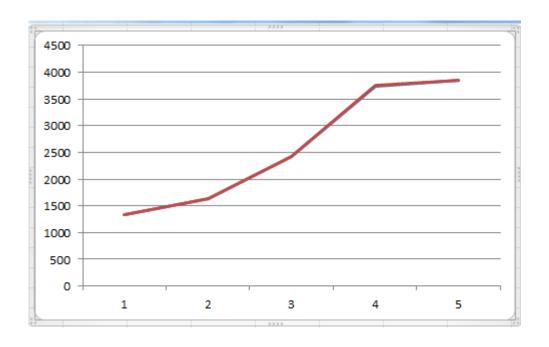

Monitoramento e Controle

Gráfico de burndown para a primeira iteração

